

PROEFKASTKEURING GEVELELEMENTEN




Bedrijf	Akulux d.o.o.	Attestnummer	0	Regeling	SKGIKOB-KOMO
Datum beproeving	8-12-2020	Projectomschrijving	0	te	0
Type keuring	Attesteringsonderzoek	Project.nr. klant:	20.01515-4.2	Merk:	0
Keurmeester(s)	KWO	Windsnelh. Gebied	Gebied I	Onbebouwd	Dakrand 40 mtr
Proefkast	Lab. SKGIKOB				
Datum kalibratie :	18-03-20	Toetsingsdruk voor de toepassing	450 Pa		
		Toetsingsdruk vlg. Attest	300 Pa		

Materiaal (A , K , S)	Aluminium	Hoofdmaten:	Breedte	1755 mm
Type element	samengesteld element		Hoogte	1750 mm
Draairichting	Beide	Vastglasged.	Breedte	820 0 0 0 mm
Systeemhuis	Schuco		Hoogte	1660 0 0 0 mm
Profielserie	AWS/ADS 65		Oppervlakte vastglas gedeelte	0,00 m2
Kozijnprofiel	364150		Oppervlakte element	3,07 m2
Vleugelprofiel	363990		Sluitnaad beweegbare delen	5,05 m1
Oppervlaktebeh.	Poedercoating		Naadlengte	16,58 m1
Mechanische verb.	n.v.t			
Hoekverbinding KGE	n.v.t.			

Merk sluitwerk	Schuco	Waterafvoer	Kozijn	Aantal	4 Afm.	Ø5 x 35 mm
Type	0		Draaideel	Aantal	2 Afm.	Ø5 x 20 mm
Aantal sluitpunten	7 IBW	Beluchting	Kozijn	Aantal	0 Afm.	0 mm
	0 Dichting		Draaideel	Aantal	2 + 2 Afm.	Ø5 x 20 mm
Beglazing :	binnen droog	5-15-4				
Paneel :	dikte 0 mm	0	Aanslagdichting:	Enkel		

Temperatuur	20,8 °C	Testmethode	A	Bedienbaarheid	
Luchtdruk	1004 hPa	Aantal nozzles 2 l/min :	5	Normaal bedienbaar ?	Ja
RV	37,9 %	Aantal nozzles 1 l/min :	0	Bedienkrachten gemeten ?	Nee
		Hoeveelheidwater (l/uur)	600		

Pa	Luchtdoorlaat	Waterlekage	STIJFHEID
0		Nee	Toetsingsdruk 1600 Pa Meetpunt 1 1,70 mm.
50	1,8	Nee	Maatgevend deel Stijl Meetpunt 2 5,30 mm.
100	2,6	Nee	Maatgevende afstand L 1650 mm. Meetpunt 3 1,50 mm.
150	3,4	Nee	Max. toelaatb. Doorb. (1/200) 8,25 mm. Doorbuiging 3,70 mm.
200	4,1	Nee	
250	4,7	Nee	
300	5,3	Nee	
350	#####		
400	#####		
450	7,2	Nee	
500	#####		
550	#####		
600	9,9	Nee	
650	#####		
Achter middendicht.	-	-	
In achterkamer	-	-	
STERKTE			
Stuwdruk Pw (Pa)	2250		
Blijvende verv. na overdruk	Nee		
Blijvende verv. na onderdruk	Nee		

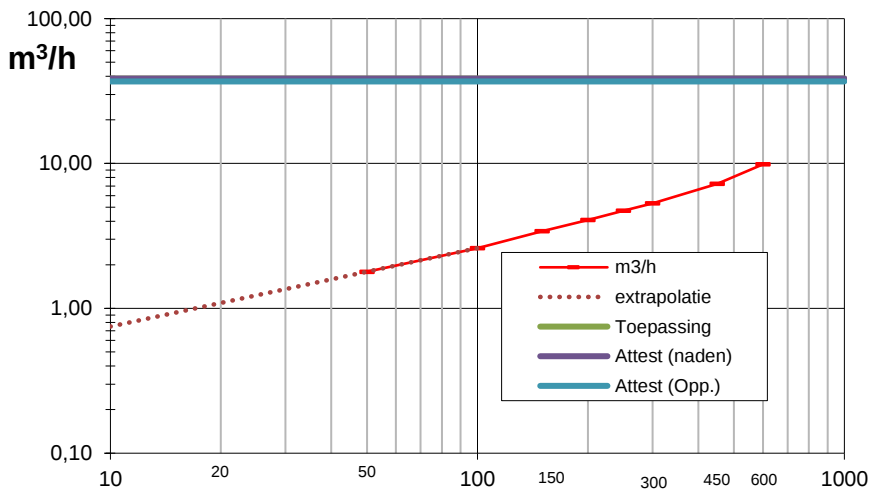

Luchtverlies bij 10 Pa vlg. grafiek										0,749 m3/h		SAMENVATTING					
Toegestaan Luchtverlies	naad I in m³/h				sluitnaad II in m³/h				totale verlies I + II + III in m³/h		Toe passing	Wind	Ja				
												Water	Ja				
Toepassing	16,58	m¹	x	0,50	=	8,29	5,05	m¹	x	6,00		=	30,30	38,59	Stijfh.	Ja	
Bij 10 Pa	16,58	m¹	x	0,10	=	1,66	5,05	m¹	x	0,40		=	2,02	3,68	Sterkte	Ja	
Attest	16,58	m¹	x	0,50	=	8,29	5,05	m¹	x	6,00		=	30,30	38,59			
Attest	Oppervlakte gevelelementen:					3,07	m²	x	12,00	m³/hm²	36,86	36,86	ATTEST	Naden	Ja		
	Oppervlakte vastglas (>1,5m2)					0,00	m²	x	1,50	m³/hm²	0,00			Opp.	Ja		
														10 Pa	Ja		
Opmerkingen :														Water	Ja		

0

Geen
